Restablished Dug hole 30'x20'
Found No Evidence

Set C.M. over 1-3" Drain Tile
Put a sandstone 10"x6"x5"
on Top C.M.

2642.0'	From Stone	North
2634.0'	"	"	East
2627.5'	"	"	South
2630.0	"	"	West
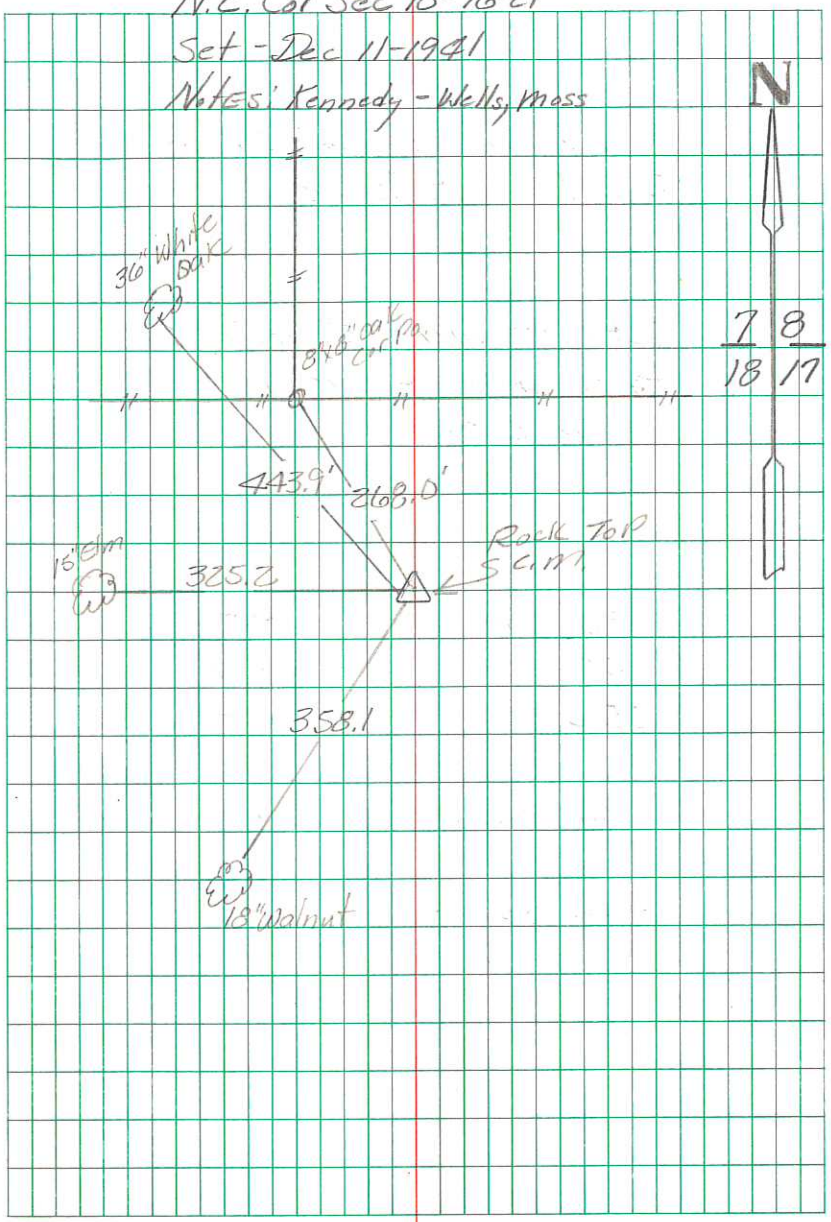
358.1'	N.E.	of	x Nails	in	18" walnut Tree
325.2'	East	"	"	"	" 15" Elm "
443.9'	S.E.	"	"	"	" 36" White Elm
268.0'	S.E.	"	"	"	" 8"x8" Oak Cor Po.
